

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
--	---	---

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 1 DEMOLICION DE APLANADO DE 1.00 A 3.00 CM DE ESPESOR EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACIÓN.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES.

HOSPITAL
DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	---	--

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 1 DEMOLICIÓN DE APLANADO DE 1.00 A 3.00 CM DE ESPESOR EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACIÓN.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

HOSPITAL
DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	--	---

| CLAVE | CONCEPTO | |-------|----------| |-------|----------|

A	ÁREAS HOSPITALARIAS
A01	TRABAJOS PRELIMINARES
1	DEMOLICIÓN DE APLANADO DE 1.00 A 3.00 CM DE ESPESOR EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACIÓN.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES

HOSPITAL
DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA		Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC		Período de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC		Numero de Contrato: 01 UNO FINIQUITO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA		Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
		Período de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
		Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 1 DEMOLICIÓN DE APLANADO DE 1.00 A 3.00 CM DE ESPESOR EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACIÓN.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

HOSPITAL
DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA		Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC		Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC		Numero de Contrato: De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA		No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO	Teléfono: 951 688 71 03
		Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
		Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
		Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 1 DEMOLICIÓN DE APLANADO DE 1.00 A 3.00 CM DE ESPESOR EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACIÓN.

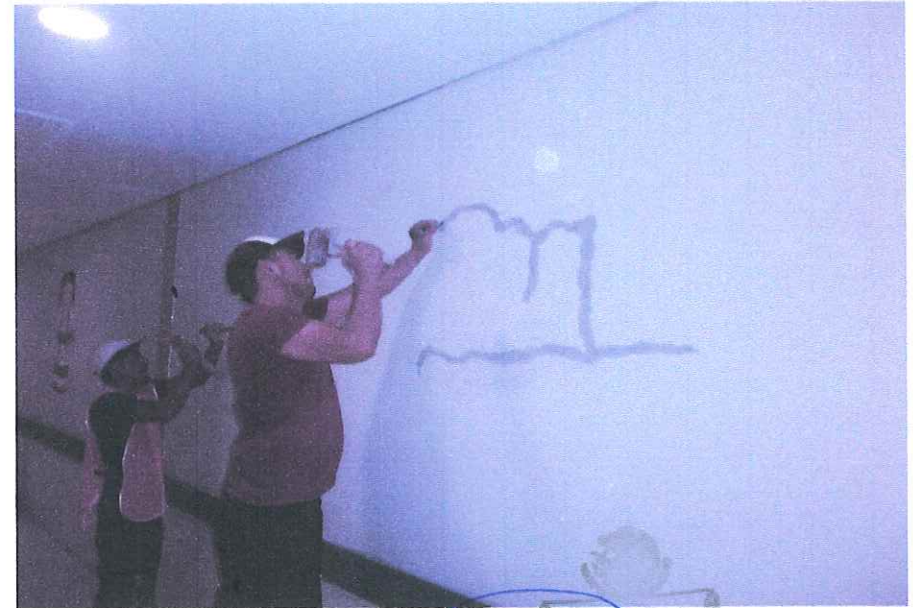

ELABORÓ

REVISÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

ADMINISTRADOR ÚNICO

GENERALES

HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA		Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC		Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC		Numero de Contrato: De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA		No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO	Teléfono: 951 688 71 03
Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION			

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 1 DEMOLICIÓN DE APLANADO DE 1.00 A 3.00 CM DE ESPESOR EN MAL ESTADO, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACIÓN.

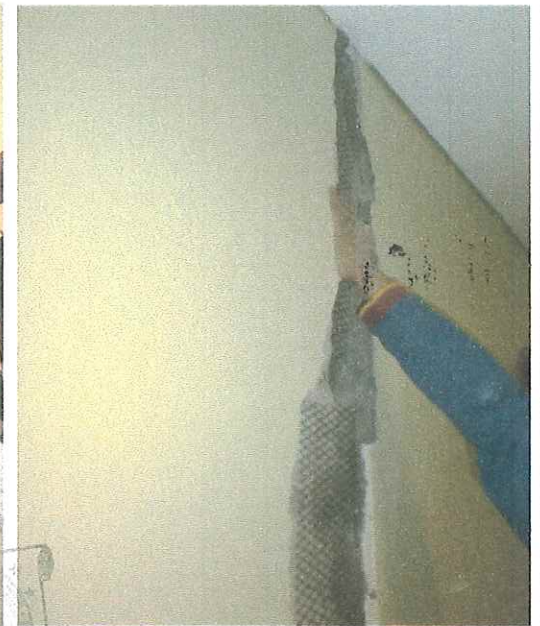

ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HNO

HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA




Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEGAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	---	---

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 2 DESMONTE DE VIDRIO DE 6 MM., DE ESPESOR, EN INTERIORES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.

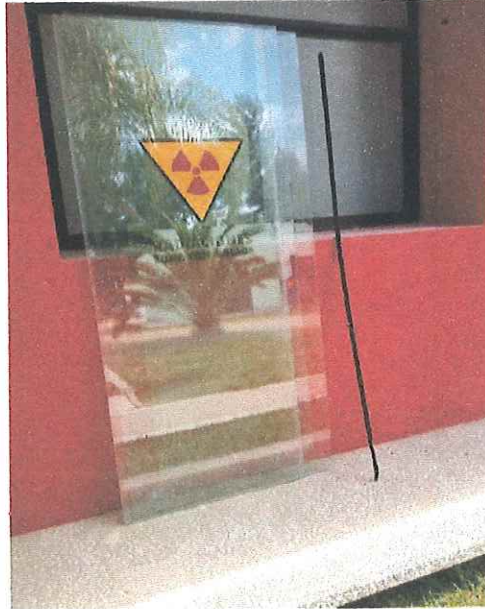

ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 2 DESMONTE DE VIDRIO DE 6 MM., DE ESPESOR, EN INTERIORES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA



Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Período de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Período de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
--	--	---

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 2 DESMONTE DE VIDRIO DE 6 MM., DE ESPESOR, EN INTERIORES, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS-MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HNO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Teléfono: 951 688 71 03

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 3 DESMONTAJE DE ACCESORIO DE BAÑOS, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.

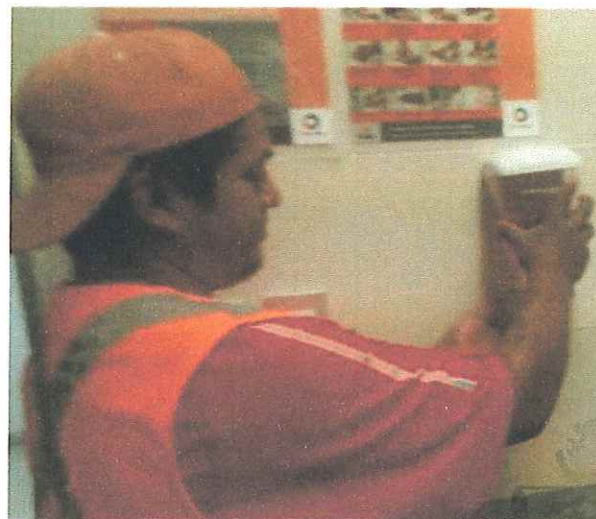

ELABORÓ

COSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra:	Monto Contrato:	\$4,999,954.68	Contratista:	CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Periodo de Contrato:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C.	CCC161118HS7
Localidad:	Numero de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	De fecha:	15 DE AGOSTO
SAN BARTOLO COYOTEPEC	No. De Estimación:	01 UNO FINIQUITO	Fecha de Elaboración:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
Municipio:	Periodo de Ejecución:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Domicilio:	AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
SAN BARTOLO COYOTEPEC	Recurso:	AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Teléfono:	951 688 71 03
Estado:				
OAXACA				

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 4 DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE LAVABO; INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.




ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALI ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTES MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra:	Mantenimiento menor y mejoramiento de las instalaciones del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	Monto Contrato:	\$4,999,954.68	Contratista:	CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad:	SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C.	CCC161118HS7
Municipio:	SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	Domicilio:	AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado:	OAXACA	No. De Estimación:	01 UNO FINIQUITO	Teléfono:	951 688 71 03
		Periodo de Ejecución:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		
		Recurso:	AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION		

CLAVE

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 4 DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE LAVABO; INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.

CONCEPTO



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTES MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES

REPORTE FOTOGRAFICO



HNO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO	Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
	Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

A ÁREAS HOSPITALARIAS

A01 TRABAJOS PRELIMINARES

4 DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE LAVABO; INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.

CONCEPTO



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra:	Mantenimiento menor y mejoramiento de las instalaciones del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	Monto Contrato:	\$4,999,954.68	Contratista:	CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad:	SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C.	CCC161118HS7
Municipio:	SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	De fecha:	15 DE AGOSTO
Estado:	OAXACA	No. De Estimación:	01 UNO FINIQUITO	Fecha de Elaboración:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
		Periodo de Ejecución:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Domicilio:	AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
		Recurso:	AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Teléfono:	951 688 71 03

CLAVE

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 4 DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE LAVABO; INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.

CONCEPTO

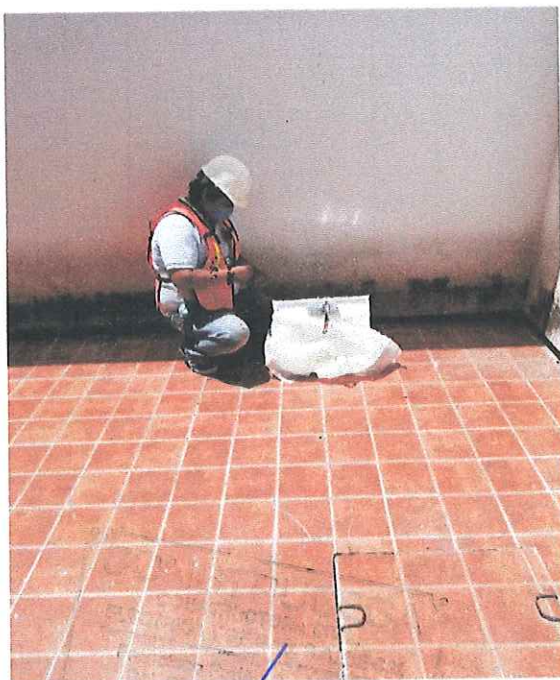

ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.


ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HNO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra:	Mantenimiento menor y mejoramiento de las instalaciones del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	Monto Contrato:	\$4,999,954.68	Contratista:	CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad:	SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C.	CCC161118HS7
Municipio:	SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	De fecha:	15 DE AGOSTO
Estado:	OAXACA	No. De Estimación:	01 UNO FINIQUITO	Fecha de Elaboración:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
		Periodo de Ejecución:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Domicilio:	AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
		Recurso:	AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Teléfono:	951 688 71 03

CLAVE

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 5 DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE FLUXÓMETRO EN WC Y MINGITORIO; INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.

CONCEPTO



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ


ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	De fecha: 15 DE AGOSTO
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO	Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
	Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Teléfono: 951 688 71 03

CLAVE

CONCEPTO

A ÁREAS HOSPITALARIAS

A01 TRABAJOS PRELIMINARES

6 RETIRO DE LOSETA 30X30 CMS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	Domicilio: AND, FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO	Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
	Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 6 RETIRO DE LOSETA 30X30 CMS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	---	---

CLAVE

CONCEPTO

A ÁREAS HOSPITALARIAS

A01 TRABAJOS PRELIMINARES

6 RETIRO DE LOSETA 30X30 CMS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO	Teléfono: 951 688 71 03
	Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
	Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 6 RETIRO DE LOSETA 30X30 CMS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Período de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Período de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
Estado: OAXACA	Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 7 RETIRO DE AZULEJO DE 20X20 CMS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE BRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.

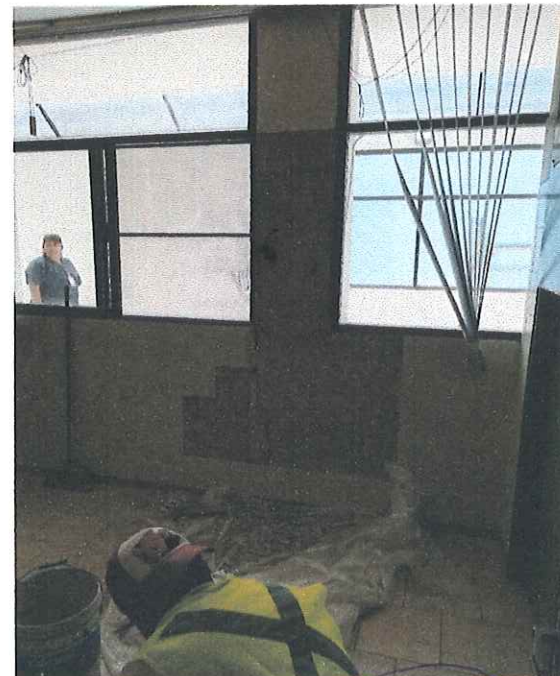


ELABORÓ

COSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
 ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
 GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	---	---

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 7 RETIRO DE AZULEJO DE 20X20 CMS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE BRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Período de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 7 RETIRO DE AZULEJO DE 20X20 CMS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE BRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.


ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ


ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO	  HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA 	
Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
CLAVE	CONCEPTO	
A A01 7	ÁREAS HOSPITALARIAS TRABAJOS PRELIMINARES RETIRO DE AZULEJO DE 20X20 CMS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE BRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.	
 		
 ELABORÓ CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV. ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ ADMINISTRADOR ÚNICO	 REVISÓ ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 	

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC181118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	De fecha: 15 DE AGOSTO
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINQUITO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
	Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 7 RETIRO DE AZULEJO DE 20X20 CMS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE BRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Período de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Período de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Teléfono: 951 688 71 03

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 7 RETIRO DE AZULEJO DE 20X20 CMS POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE BRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

HOSPITAL DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HNO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	De fecha: 15 DE AGOSTO
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINQUITO	Domicilio: AND, FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
	Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
	Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

A ÁREAS HOSPITALARIAS

A01 TRABAJOS PRELIMINARES

8 RETIRO DE FALSO PLAFÓN DE PANEL DE YESO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.



ELABORÓ


REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra:	Mantenimiento menor y mejoramiento de las instalaciones del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	Monto Contrato:	\$4,999,954.68	Contralista:	CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad:	SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C.	CCC161118HS7
Municipio:	SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	De fecha:	15 DE AGOSTO
Estado:	OAXACA	No. De Estimación:	01 UNO FINIQUITO	Fecha de Elaboración:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
		Periodo de Ejecución:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Domicilio:	AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
		Recurso:	AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Teléfono:	951 688 71 03

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 8 RETIRO DE FALSO PLAFÓN DE PANEL DE YESO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.

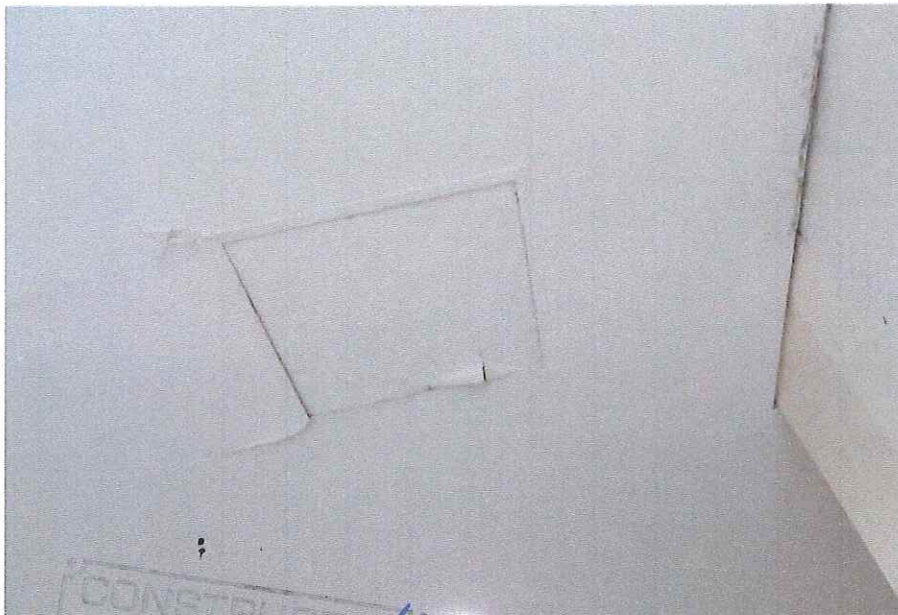

ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO



HNO





HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra:	Mantenimiento menor y mejoramiento de las instalaciones del Hospital de la Niñez Oaxaqueña	Monto Contrato:	\$4,999,954.68	Contratista:	CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad:	SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C.	CCC161118HS7
Municipio:	SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	De fecha:	15 DE AGOSTO
Estado:	OAXACA	No. De Estimación:	01 UNO FINIQUITO	Fecha de Elaboración:	08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
		Periodo de Ejecución:	DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Domicilio:	AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
		Recurso:	AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Teléfono:	951 688 71 03

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 8 RETIRO DE FALSO PLAFÓN DE PANEL DE YESO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.

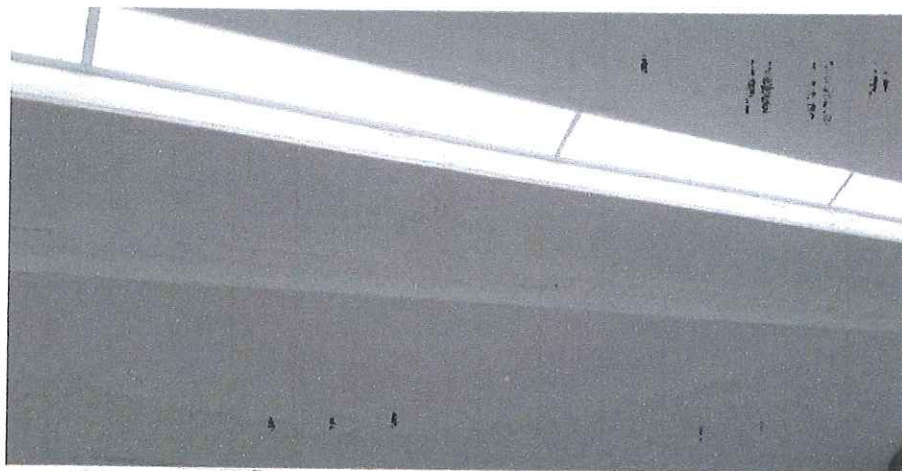

ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO



HNO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	R.F.C.: CCC161118HS7
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
	Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
	Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 8 RETIRO DE FALSO PLAFÓN DE PANEL DE YESO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS HASTA UNA PRIMERA ESTACION.

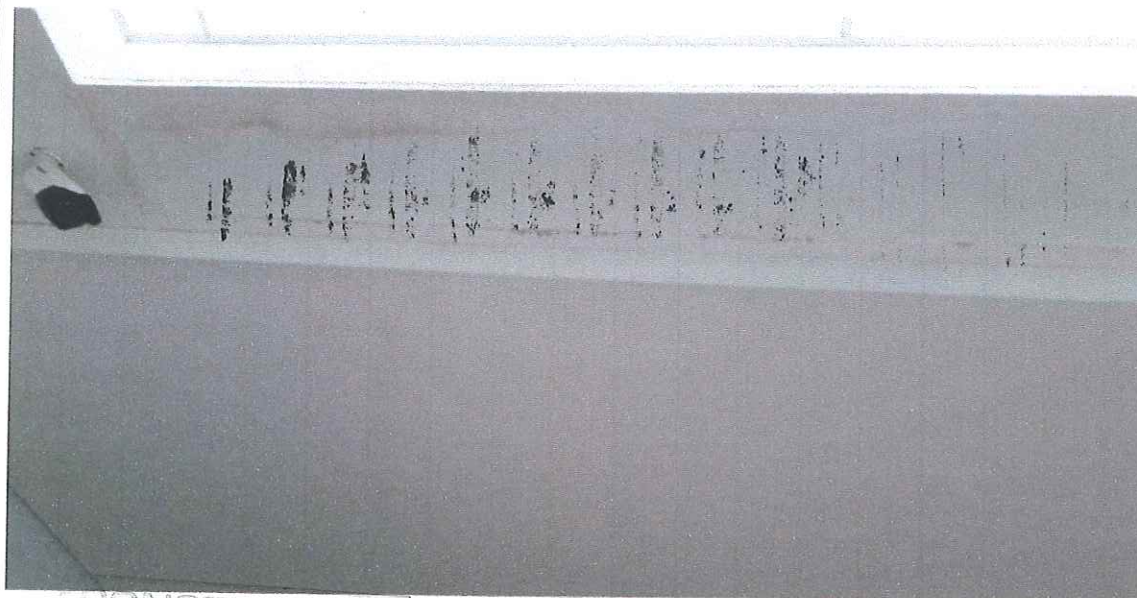

CONSTRUCEGA

ELABORÓ

REVISÓ

Francisco Patiño Cruz N.

Col. Benito Flores

Ing. Eliseo Neftalí Altamirano Cruz

Administrador Único

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.


ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	---	--

CLAVE

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.

CONCEPTO

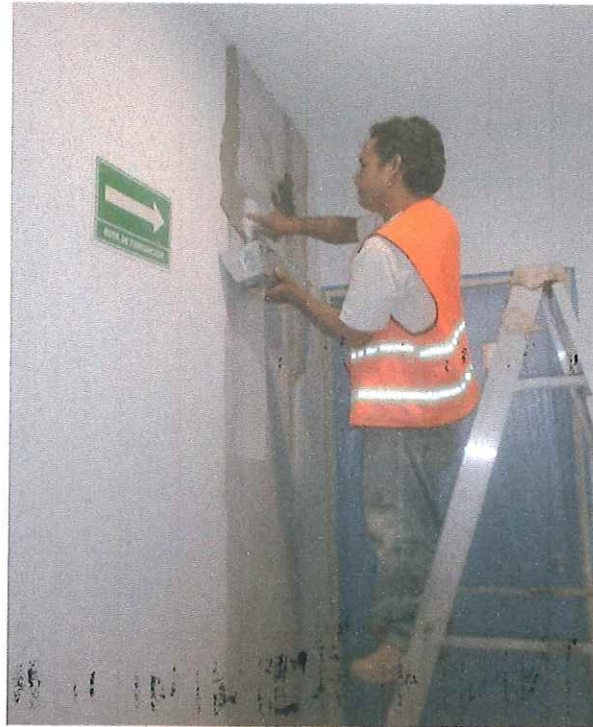

ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Período de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
	Período de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
	Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.




ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



HOSPITAL DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NINEZ OAXAQUENA



Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	--	---

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.




ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



2018-08-22
HOSPITAL
DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEGAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	--	---

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.




ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	---	--

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ


ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTES MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO





HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEA02018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC181118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	---	---

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.

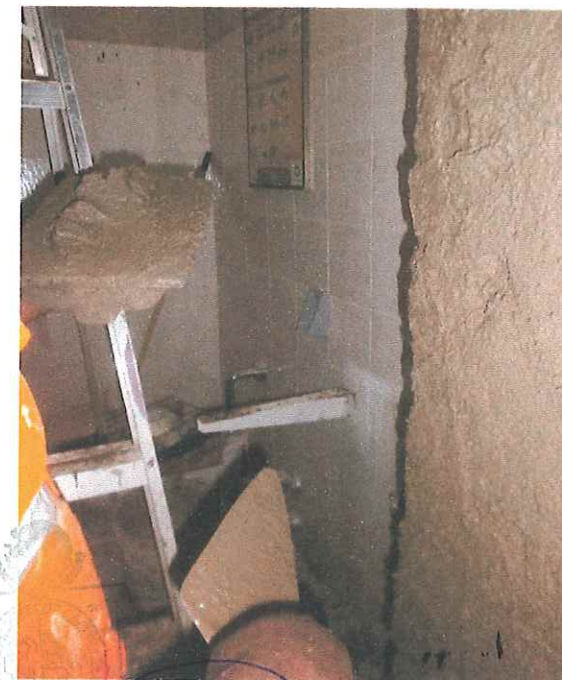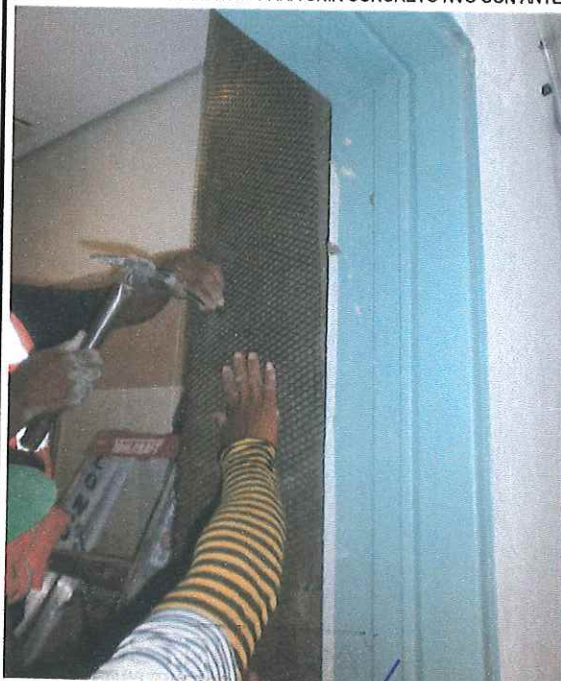

ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA GENERALES

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	---	---

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ


ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES



REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.



ELABORÓ

COSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

DE LA NIÑEZ GENERALES

OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HNO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCG161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.

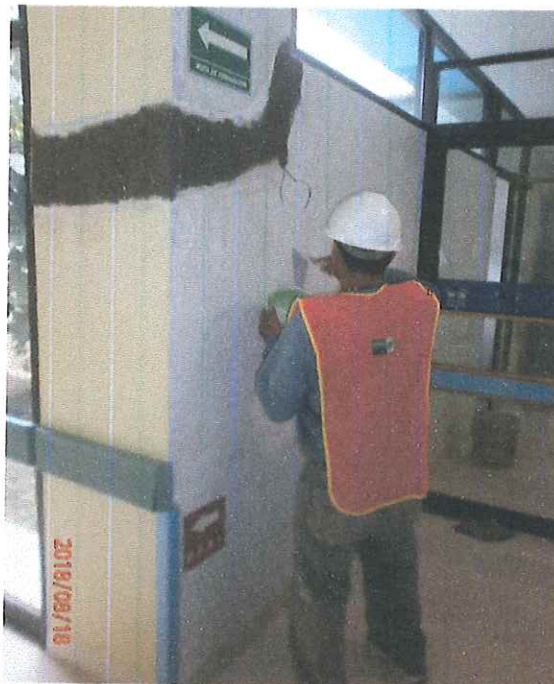

ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

HOSPITAL
DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO





HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
	Recurso: AAAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.

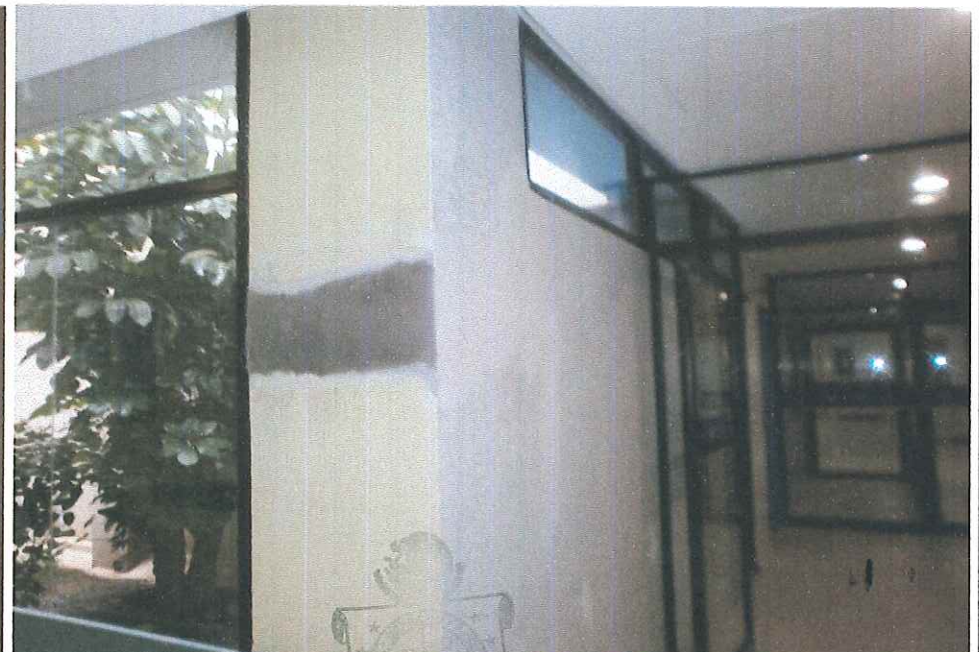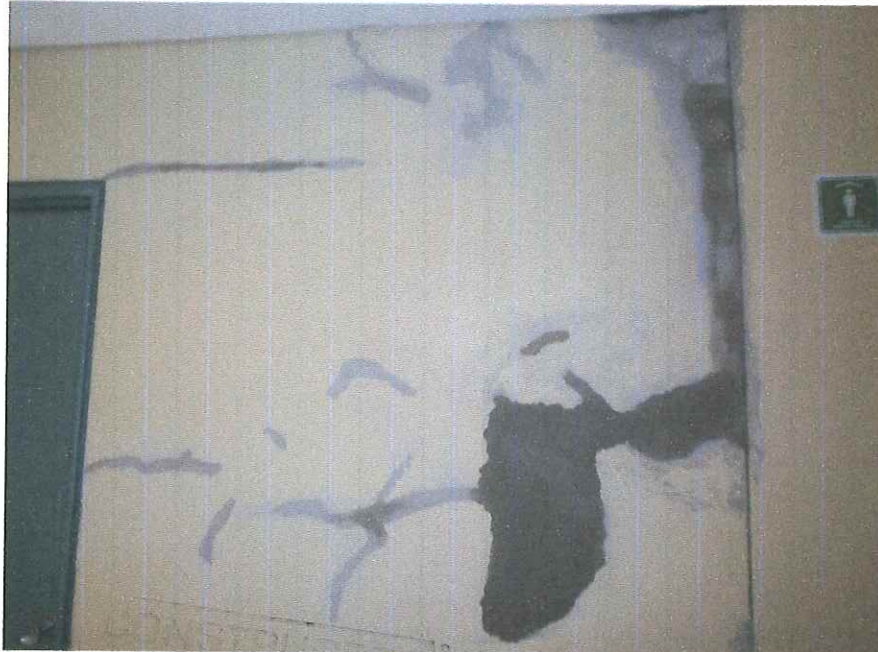

ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEA002018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	--	---

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.



ELABORÓ

Col. Ricardo Flores
Oaxaca de Juárez, Oax.
Tel: (951) 688 71 03

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
Estado: OAXACA	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
	Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTES MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

REPORTE FOTOGRAFICO



HNO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AAAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC181118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	--	---

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
	Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

- A ÁREAS HOSPITALARIAS
- A01 TRABAJOS PRELIMINARES
- 9 REPARACION Y REPOSICION DE APLANADOS EN MUROS Y COLUMNAS PREVIO PROCEDIMIENTO DE ESTRUCTURADO DEL MISMO, A SABER: ANCLAJE DE VARILLAS, PARA SOPORTE DE METAL DESPLEGADO, APLICACIÓN DE ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NVO CON ANTERIOR Y AFINE CON COVERMIX.



ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTES MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES

HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	
	Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

A ÁREAS HOSPITALARIAS
A02 ALBAÑILERIA

11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE PANEL DE YESO CORRIDO LISO, BASTIDOR ESTRUCTURADO CON PERFILES DE CANALETA GALVANIZADA DE CARGA @ 1.22 Y CANAL LISTON @ 61 CM. Y CON ANGULO GALVANIZADO DE 1/2" EN EL PERIMETRO, UNIDOS ENTRE SI CON TORNILLO FRAMER, COLGANTO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 PRETENSADO, ASI MISMO LA FIJACION A LOSAS SERA CON CLAVOS DNI-27 Y ANCLA PREMONTADO EN ÁNGULO A LOSA DE CONCRETO, COLOCADOS CON PISTOLA DE IMPACTO A UNA ALTURA DE LOSA DE 9.00 M Y ALTURA DE PLAFON DE 4.50 M, REVESTIMIENTO POR UNA CARA CON PANEL DE YESO ESTANDAR DE 12.7 MM (1/2") X 1.22 (4') X 2.44 (8') CON UN PESO DE 23.8 KG LA HOJA., COMPUESTO CON YESO DE ALTA CALIDAD Y AGREGADOS Y FIBRA DE CELULOSA EN SU NUCLEO, FIJACION A BASTIDOR CON TORNILLOS S-1, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE PAPEL DE REFUERZO Y COMPUESTO PREMEZCLADO SIN ASBESTO PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS ACABADO APARENTE. (CHECAR PLANOS DE PLAFONES) . INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, COLGANTO EN AMBOS SENTIDOS, CORTES, NIVELACIÓN, ESCUADRADO, DETALLES, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA Y ACARREO FUERA DE LA MISMA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.



ELABORÓ

REVISÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.

ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ

ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. ROBERTA CORTÉS MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES

HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO	Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
	Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
	Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	


CLAVE

CONCEPTO

A ÁREAS HOSPITALARIAS

A02 ALBAÑILERIA

11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE PANEL DE YESO CORRIDO LISO, BASTIDOR ESTRUCTURADO CON PERFILES DE CANALETA GALVANIZADA DE CARGA @ 1.22 Y CANAL LISTON @ 61 CM. Y CON ANGULO GALVANIZADO DE 1/2" EN EL PERIMETRO, UNIDOS ENTRE SI CON TORNILLO FRAMER, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 PRETENSADO, ASI MISMO LA FIJACION A LOSAS SERA CON CLAVOS DNI-27 Y ANCLA PREMONTADO EN ANGULO A LOSA DE CONCRETO, COLOCADOS CON PISTOLA DE IMPACTO A UNA ALTURA DE LOSA DE 9.00 M Y ALTURA DE PLAFON DE 4.50 M, REVESTIMIENTO POR UNA CARA CON PANEL DE YESO ESTANDAR DE 12.7 MM (1/2") X 1.22 (4') X 2.44 (8') CON UN PESO DE 23.8 KG LA HOJA., COMPUESTO CON YESO DE ALTA CALIDAD Y AGREGADOS Y FIBRA DE CELULOSA EN SU NUCLEO, FIJACION A BASTIDOR CON TORNILLOS S-1, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE PAPEL DE REFUERZO Y COMPUESTO PREMEZCLADO SIN ASBESTO PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS ACABADO APARENTE. (CHECAR PLANOS DE PLAFONES) . INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, COLGANTEO EN AMBOS SENTIDOS, CORTES, NIVELACIÓN, ESCUADRADO, DETALLES, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA Y ACARREO FUERA DE LA MISMA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.

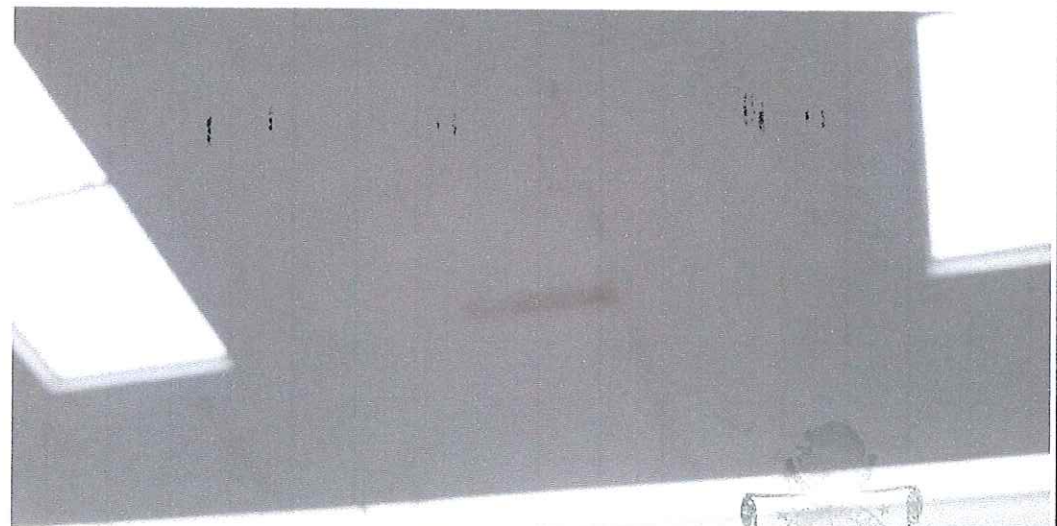

ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTES MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES

HOSPITAL
DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO




HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	Monto Contrato: \$4,999,954.68	Contralista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V.
Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	R.F.C. CCC161118HS7
Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC	Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO	Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA
Estado: OAXACA	No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Teléfono: 951 688 71 03
Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Recurso: AEA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	

CLAVE

CONCEPTO

A	ÁREAS HOSPITALARIAS
A02	ALBAÑILERIA
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE PAVEL DE YESO CORRIDO LISO, BASTIDOR ESTRUCTURADO CON PERFILES DE CAJALETA GALVANIZADA DE CARGA @ 1.22 Y CAJAL LISO @ 91 CM. Y CON ANGULO GALVANIZADO DE 1/2" EN EL PERIMETRO, UNIDOS ENTRE SI CON TORNILLO FRAMER, COLGANTO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 PRETENSADO, ASI MISMO LA FIJACION A LOSAS SERA CON CLAVOS DNI-27 Y ANCLA PREMONTADO EN ANGULO A LOSA DE CONCRETO, COLOCADOS CON PISTOLA DE IMPACTO A UNA ALTURA DE LOSA DE 9.00 M Y ALTURA DE PLAFON DE 4.50 M, REVESTIMIENTO POR UNA CARA CON PANEL DE YESO ESTANDAR DE 12.7 MM (1/2") X 1.22 (4') X 2.44 (8') CON UN PESO DE 23.8 KG LA HOJA., COMPUESTO CON YESO DE ALTA CALIDAD Y AGREGADOS Y FIBRA DE CELULOSA EN SU NUCLEO, FIJACION A BASTIDOR CON TORNILLOS S-1, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE PAPEL DE REFUERZO Y COMPUESTO PREMEZCLADO SIN ASBESTO PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS ACABADO APARENTE. (CHECAR PLANOS DE PLAFONES) . INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, COLGANTO EN AMBOS SENTIDOS, CORTES, NIVELACIÓN, ESCUADRADO, DETALLES, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA Y ACARREO FUERA DE LA MISMA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.I.O.T

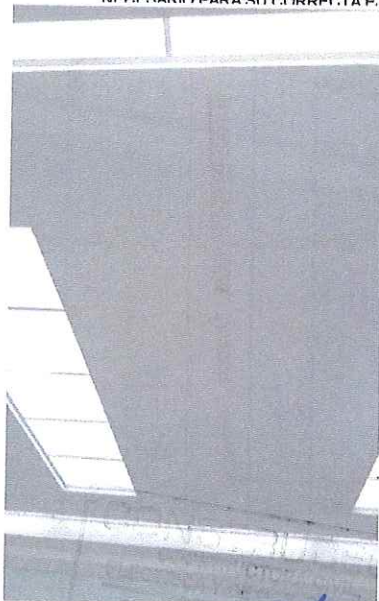

ELABORÓ

REVISÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELÉCTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ING. ROBERTA CORTES MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES

HOSPITAL DE LA NIÑEZ
OAXAQUEÑA

REPORTE FOTOGRAFICO



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA

Obra: MANTENIMIENTO MENOR Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA Localidad: SAN BARTOLO COYOTEPEC Municipio: SAN BARTOLO COYOTEPEC Estado: OAXACA	Monto Contrato: \$4,999,954.68 Periodo de Contrato: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Numero de Contrato: CONTRATO DE OBRA PUBLICA 26-HNO-2018 De fecha: 15 DE AGOSTO No. De Estimación: 01 UNO FINIQUITO Fecha de Elaboración: 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Periodo de Ejecución: DEL 16 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 Recurso: AEAAA2018 ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION	Contratista: CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE C.V. R.F.C. CCC161118HS7 Domicilio: AND. FRANCISCO PATIÑO CRUZ # 110 FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA Teléfono: 951 688 71 03
---	--	---

CLAVE

CONCEPTO

A ÁREAS HOSPITALARIAS

A02 ALBAÑILERIA

11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE PANEL DE YESO CORRIDO LISO, BASTIDOR ESTRUCTURADO CON PERFILES DE CANALETA GALVANIZADA DE CARGA @ 1.22 Y CANAL LISTON @ 61 CM. Y CON ANGULO GALVANIZADO DE 1/2" EN EL PERIMETRO, UNIDOS ENTRE SI CON TORNILLO FRAMER, COLGANTEO CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 PRETENSADO, ASI MISMO LA FIJACION A LOSAS SERA CON CLAVOS DNI-27 Y ANCLA PREMONTADO EN ANGULO A LOSA DE CONCRETO, COLOCADOS CON PISTOLA DE IMPACTO A UNA ALTURA DE LOSA DE 9.00 M Y ALTURA DE PLAFON DE 4.50 M, REVESTIMIENTO POR UNA CARA CON PANEL DE YESO ESTANDAR DE 12.7 MM (1/2") X 1.22 (4') X 2.44 (8') CON UN PESO DE 23.8 KG LA HOJA., COMPUESTO CON YESO DE ALTA CALIDAD Y AGREGADOS Y FIBRA DE CELULOSA EN SU NUCLEO, FIJACION A BASTIDOR CON TORNILLOS S-1, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE PAPEL DE REFUERZO Y COMPUESTO PREMEZCLADO SIN ASBESTO PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS ACABADO APARENTE. (CHECAR PLANOS DE PLAFONES) . INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES A CUALQUIER ALTURA, TRAZO, COLGANTEO EN AMBOS SENTIDOS, CORTES, NIVELACIÓN, ESCUADRADO, DETALLES, LIJADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA Y ACARREO FUERA DE LA MISMA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.




ELABORÓ

CONSTRUCTORA CONSTRUCCION CIVIL, ELECTRICA Y DE GAS S.A. DE CV.
ING. ELISEO NEFTALÍ ALTAMIRANO CRUZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

REVISÓ

ING. ROBERTA CORTES MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES



HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA
